



Groupe Technique de Travail

(GTT/TWIG) mercredi 18.05.2022

Agenda:

1. Ouverture : BNGRC – MPPSPF
2. Validation agenda
3. Présentation doc Implémentation (CRM/IFRC)
4. Question et réponses / Recommandations / synthèse et compilation
5. Conclusion et actions (next step)
6. Fermeture : BNGRC – MPPSPF





Groupe Technique de Travail (GTT/TWIG) mercredi 18.05.2022

Proposition de modalités d'implémentation de Transfert Monétaire pour l'Habitat (TMC.H / Cash for Shelter)

Réponse Cyclones Batsirai et Emnati
Madagascar 2022



Cluster Abris / Habitat Madagascar
ShelterCluster.org
Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



*Niaina NTK (CRM)
Pascal Panosetti (IFRC)
Madagascar 18 mai 2022*

Rappel des points clés de l'élaboration de la "Stratégie cash dans le cadre de la reconstruction partielle d'habitations suite aux cyclones Batsirai et Emnati"

validée le 29.03.2022 par le BNGRC, MPPSPF et la CRM et finalisée le 02.04.2022

- Aider les ménages à réparer leur maison grâce à une aide en argent liquide conditionnalisé (Transfert Monétaire Conditionnel)

Situation de la reconstruction :

- 30 – 50% des ménages ont commencé a reconstruire après 2 semaines
- 80% après 3 semaines;
- Certains ménages qui ont commencé la réparation disent s'être endettés jusqu'à 160,000 Ar
- + 90% après 1 mois Conditionnalité du CASH Ar 350 000 : participation à la formation, utilisation d'une fiche de suivi avec la liste des paniers


OBJECTIF GLOBAL CASH

- Amélioration des conditions d'hébergement / habitat des familles touchées par les cyclones BATSIRAI – EMNATI
- Les ménages affectés bénéficient d'argent liquide conditionnalisé en plusieurs tranches

CONDITIONNALITÉS SUGGÉRÉES

1. Participation à la séance de sensibilisation en construction améliorée BBS > **Conditionnalité 1**
2. Achat de matériaux, outils et/ou engagement de main d'œuvre > **Conditionnalité 2 (3 & 4)**
3. Renforcement des maisons par contreventements, construction améliorée BBS > **Conditionnalité 2 (3 & 4)**

Conditionnalités 2, 3, 4 : exemple de construction améliorée BBS

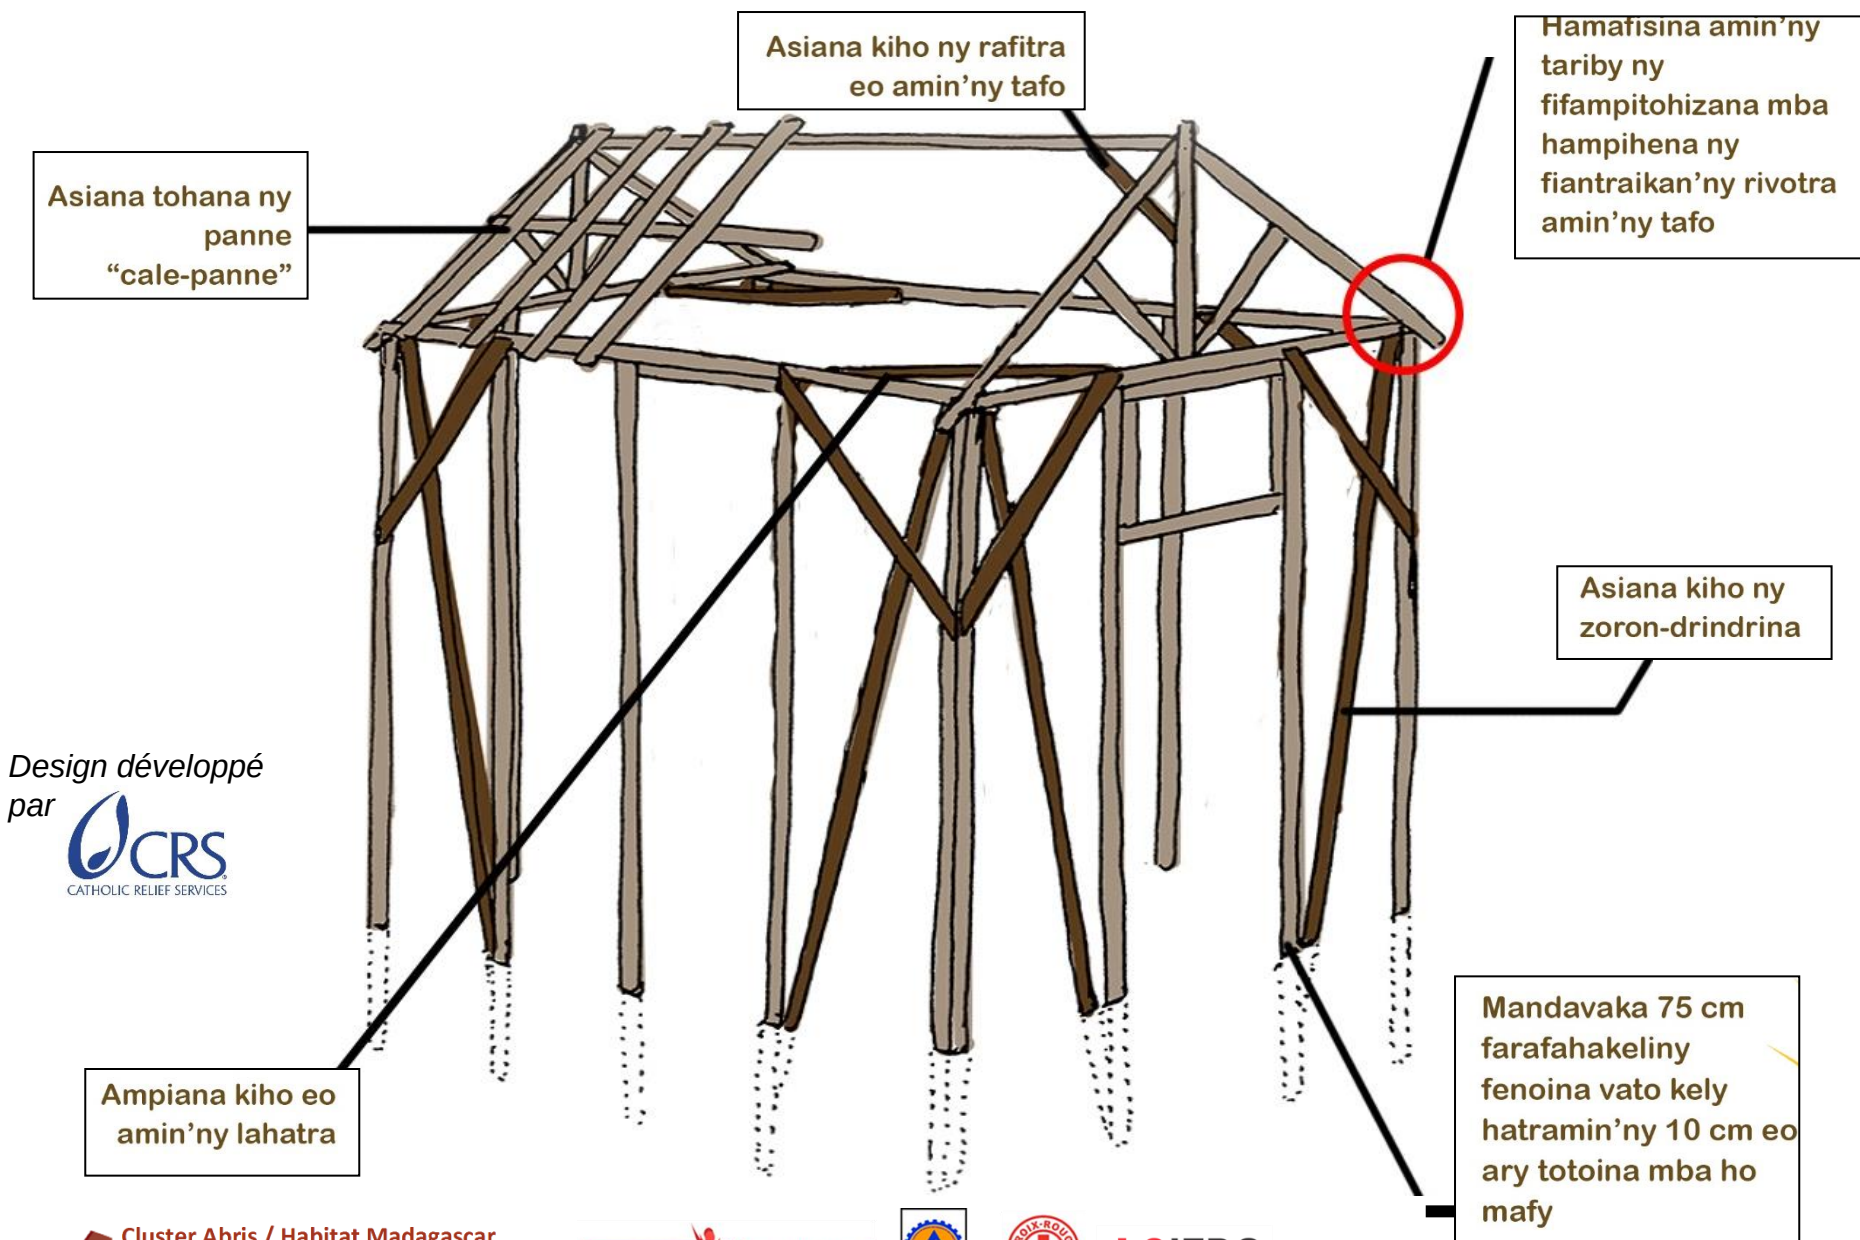

Design développé
par **OCRS**
CATHOLIC RELIEF SERVICES

Conditionnalité 2 : exemple de construction améliorée BBS illustrées

Conditionnalité 1	Conditionnalité 2	Conditionnalité 3	Conditionnalité 3
			
Participation à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation "fiches suivi" et comptabilité basic	Achat matériaux, main d'oeuvre, contreventements diagonal extérieur installés entre les poteaux au 4 angles de la maison	Contreventements horizontal de 70 cm minimum installés au 4 angles de la maison installés avec 4 clous 7cm	Fermes avec contrefiches installées. Chaque connection fixée avec 3 clous de 7 ou 10cm ou 1 clou minimum entre tenons et mortaises
Conditionnalité 3	Conditionnalité 4	Conditionnalité 4	Conditionnalité 4
			
Contreventements diagonal entre poteaux principaux et panne faîtière installés	3 clous 7 ou 10cm utilisés entre contreventements/poteaux et autres liaisons structurelles et 1 clou entre lisses hautes et tenons poteau	Liaison poteau-lisse basse renforcée : entourée de fil d'acier, corde ou liane installés	1 ou 2 clous, 4 à 7cm, utilisés entre mortaise des lisses hautes et les tenons des poteaux

Référence outil d'implémentation TMC.H
 « 220504_V3_Fiche de suivi TMC Habitat »

Exemple de fiche de suivi du Transfert Monétaire par tranche selon conditionnalités comme source de vérification

Opératifs Batsirai

Suivi par ménage du cash conditionnel pour Abri FICHE 1 : MATERIAUX/MAIN D'OEUVRE

Nom et prénom du chef de ménage : _____

Région : _____ District : _____

Fokontany : _____ Hameau : _____

Argent utilisé pour	Montant utilisé
 Main d'oeuvre: Boss charpentier	Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant:
 Main d'oeuvre: Aide charpentier	Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant:
 Outils	Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant:
 Falafa, paquet de..... Pces (tige des feuilles de Ravanala tressée pour les cloisons)	Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant:
 Rapaka (planche de Ravanala (planche de Ravanala))	Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant:
 Rati, paquet de..... Pces (feuille de Ravanala pour la ouverture)	Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant: Date:/...../2022 Montant:

Opératifs Batsirai

Suivi par ménage du cash conditionnel pour Abri FICHE 2 : CONSTRUCTION AMELIOREE

Nom et prénom du chef de ménage : _____

Région : _____ District : _____

Fokontany : _____ Hameau : _____

Argent utilisé pour	Montant utilisé
 STURCTURE RENFORCÉE: Contreventements diagonal extérieur installés entre les poteaux au 4 angles de la maison	Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON
 STURCTURE RENFORCÉE: Contreventements horizontal de 70 cm minimum installés au 4 angles de la maison installés avec 4 clous de 7cm	Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON
 TOITURE RENFORCÉE: Fermes avec contrefiches installées. Chaque connection fixée avec 3 clous de 7 ou 10cm ou 1 clou minimum entre tenons et mortaises	Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON
 TOITURE RENFORCÉE: Contreventements diagonal entre poteaux principaux et panne faitière installés	Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON
 CONNECTIONS RENFORCÉES: Connections poteau-lisse basse renforcées : entourées de fil d'acier, corde ou liane installés	Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON
 CONNECTIONS RENFORCÉES: 3 clous 7 ou 10cm utilisés entre contreventements/poteaux et autres liaisons structurelles et 1 clou minimum entre lisses hautes et tenons poteau	Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON Date:/...../2022 ☐ OUI ☐ NON



CRITERES DE SELECTION SUGGÉRÉS

Critères de vulnérabilité et de sélection proposé
pour le Transfert Monétaire pour l'Habitat

#	A. Critère de base de sélection	
1	Ménages ayant une maison détruite ou endommagée (décoiffée / inondée selon les cas)	
2	Ménages endettés pour reconstruire leur maison	
#	B. Vulnérabilité	Score de vulnérabilité
1	Enfants chef de ménage (0-17 ans / né avant le 1er mai 2004)	9
2	Personnes en Situation de Handicap (PSH) vivant seules	9
3	Personnes âgées vivant seules (60+ /né après le 1er mai 1962)	9
4	Ménages avec femmes allaitantes ou enceinte chef de ménage	9
5	Personnes atteintes maladies invalidantes, chronique, grave vivant seule	9

Cependant les critères de sélection pourront être adaptés avec le comité de ciblage et reconstruction car les vulnérabilités changent selon les localités.




Cluster Abris / Habitat Madagascar
ShelterCluster.org
Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+ C IFRC

METHODE D'IMPLEMENTATION

2 OPTIONS POSSIBLE

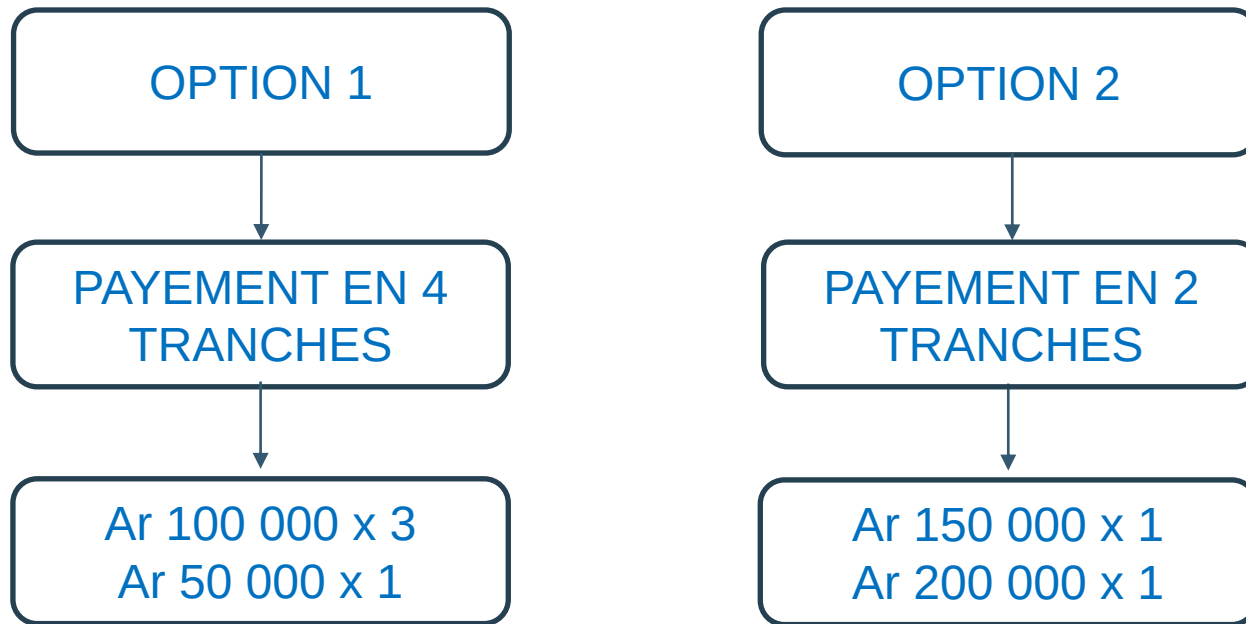

1^{er} OPTION : PAYEMENT EN 4 TRANCHES

1er VRST

Condition : Participation à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation “remplissage des fiches de suivi” et “tenue du journal de dépense

Distribué une semaine après la séance de sensibilisation et formation

Source de vérification :
liste de présence

2ème
VRST

Condition : Achat de matériaux et/ou engagement de main d'œuvre et travaux réalisés : Renforcement de la maison par contreventements diagonaux extérieurs ou autre amélioration (BBS)

Distribué uniquement après approbation de la condition de la 2ème tranche

Source de vérification :
dépense pour les matériaux, journal de caisse, fiches de suivi



Cluster Abris / Habitat Madagascar

ShelterCluster.org

Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+C IFRC

PAYEMENT EN 4 TRANCHES

3ème
VRST

Condition : Travaux BBS obligatoires réalisés: Renforcement de la maison par contreventements horizontaux et diagonaux intérieurs + ferme de toiture avec contrefiches ou autre amélioration

Distribué uniquement après approbation de la condition de la 3ème tranche

Source de vérification :
Journal de caisse
et fiche de suivi

4ème
VRST

Condition : Travaux BBS réalisés: Renforcement de la maison par liaisons solides des connections ou autre amélioration ou autre amélioration (BBS)

Distribué uniquement après approbation de la condition de la 4ème tranche

Source de vérification :
Journal de caisse
et fiche de suivi



2ème **OPTION : PAYEMENT EN 2 TRANCHES**

1er VRST

Condition : Participation à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation “remplissage des fiches de suivi” et “tenue du journal de dépense

Distribué une semaine après la séance de sensibilisation et formation

Source de vérification :
liste de présence

2ème VRST

Condition : Achat de matériaux et/ou engagement de main d'œuvre et travaux réalisés : Renforcement de la maison par contreventements horizontaux et diagonaux intérieurs + ferme de toiture avec contrefiches ou autre amélioration (BBS) / Renforcement de la maison par liaisons solides des connections ou autre amélioration (BBS)

Distribué uniquement après approbation de la condition de la 2ème tranche

Source de vérification :
dépense pour les matériaux,
journal de caisse, fiches de suivi



Cluster Abris / Habitat Madagascar

ShelterCluster.org

Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+ **IFRC**

AVANTAGE 2 TRANCHES

- Réception du cash adapté à la rapidité de reconstruction d'une maison nécessitant 5 à 7 jours.
- Réparation des maisons et assistance aux ménages rapides
- Travail logistique, admin, RH et de distribution plus léger qu'en 4 tranches
- Distribution rapide du montant total en 2 semaines minimum

AVANTAGE 4 TRANCHES

- Risque plus limité de mauvaise utilisation du cash (perte moindre)
- exemple : si le ménage n'a pas utilisé l'argent pour la reconstruction et donc retiré du programme



INCONVÉNIENT 2 TRANCHES

- Sécurité: si distribution mal gérer et peu de suivi par le staff du partenaire, risque d'une mauvaise orientation de cash par le bénéficiaire

Note: le risque 0 n'existe pas dans le cash conditionnel

- Si la communication auprès des communautés n'est pas claire, le montant du TMC plus élevé que celui du multipurpose cash pourrait créer des incompréhension au sein de la communauté

INCONVÉNIENT 4 TRANCHES

- Demande beaucoup de temps et de RH pour le suivi et les distributions
- Distribution du montant total très lente en 4 semaines minimum et augmentant les coût du projet et les déplacements du staff et de Telma par exemple
- Sécurité: si distribution mal gérer et peu de suivi par le staff du partenaire, risque d'une mauvaise orientation de cash par le bénéficiaire



ACTIVITÉS POUR L'IMPLÉMENTATION DU PROGRAMME DE TRANSFERT MONÉTAIRE CONDITIONNEL

1. Étude de marché et accord avec les vendeurs et transporteurs pour fixer les prix et éviter les inflations du coût des matériaux
2. Développement des outils de gestion et suivi du program TMTC
3. Définition des critères de sélection des bénéficiaires plus stricte spécifique au TMC
4. Développement du questionnaire d'évaluation et formation des évaluateurs
5. Développement du système de collection des plaintes à mettre en place avec la communauté
6. Développement et mise en place d'un système de communication avec la communauté
7. Développement du matériel didactique de sensibilisation et formation en BBS
8. Mobilisation Communautaire: création du "comité de ciblage et reconstruction" et développement du mécanisme de plainte
9. Construction d'une ou plusieurs maisons améliorées modèles dans la commune ciblée / formation des charpentiers locaux
10. Évaluation des besoins et des vulnérabilités (+ photo des maisons et bénéficiaires si possible)
11. Sélection des bénéficiaires et création de groupes de ménages bénéficiaire (optionnel)



ACTIVITÉS POUR L'IMPLÉMENTATION DU PROGRAMME DE TRANSFERT MONÉTAIRE CONDITIONNEL

11. Lettre d'engagement entre l'organisation, le maire de la commune, le comité de ciblage de chaque Fokontany et reconstruction et les bénéficiaires.
12. Sensibilisations des bénéficiaires, du comité et des charpentiers en construction améliorée (BBS) , conditionnalité N°1.
13. Formation sur le remplissage des fiches de suivi et du journal de dépenses, conditionnalité N°1.
14. Distribution du Transfert Monétaire en plusieurs tranches, sous conditionnalités à respecter par les bénéficiaires pour chaque versement.
15. Soutien technique aux ménages et supervision quotidienne tout au long du programme



Chronogramme des activités Projet standard Transfert monétaire conditionnel pour Habitat en 4 tranches (Cash for Shelter)

Description	Semaines								
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Préparation du questionnaire d'évaluation									
Finalisation des modalités de transfert et stratégie									
Développement des outils de suivi									
Preparation materiel sensibilisation / formation									
Etude de marché auprès des fournisseur/transporteur + contrat									
Accord avec cash provider (Telma, Poste, Banque)									
Mobilisation communautaire : processus et critère sélection									
Mobilisation communautaire (leader, gpes, comité)									
Formation des enquêteurs/évaluateur									
Evaluation des besoins (nouveau questionnaire)									
Analyse, sélection des bénéficiaires et validation									
Signature d'un accord cadre avec les bénéficiaires ou le comité									
Option: Achat et distribution kit outils									
Achat matériaux pour construction maison model									
Construction model house (formation)									
Formation des charpentiers (1 par Fokontany)									
Sensibilisation des bénéficiaires en construction plus sûre - BBS									
Formation des bénéficiaires en comptabilité basic									
Support technique aux bénéficiaires									
Distribution 1er transfert monétaire conditionnel					1er				
Post Distribution Monitoring : validation versement suivant									
Distribution 2ème transfert monétaire conditionnel						2è			
Post Distribution Monitoring : validation versement suivant									
Distribution 3ème transfert monétaire conditionnel							3è		
Post Distribution Monitoring : validation versement suivant									
Distribution 4ème transfert monétaire conditionnel								4è	
Post Distribution Monitoring final : reporting									



Cluster Abris / Habitat Madagascar
ShelterCluster.org
Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+CIFRC

2 semaines à supprimer en 2 tranches

Liste du panier pour Habitat (Cash for Shelter) - secteur Habitat

Liste du panier à remettre aux bénéficiaires comme référence.

#	DESIGNATION	Unité 1	Quantité	Unité 2	nbre	Prix unitaire	Montant total
A	MATERIAUX BOIS & "RAVINALA"					sous-total A	235'000.00
1	Bois carré scié de 8cm x 8cm x 400cm (bois dur)	pce	8	unité	1	11'000	88'000
2	Bois rond de Ø 8cm x 400cm (bois dur du pays)	pce	4	unité	1	7'000	28'000
3	Bois rond de Ø10 x 400cm pour pilotis (bois dur)	pce	4	unité	1	9'000	36'000
4	Bois dur - Planche de 2cm x 15cm x 400cm	pce	4	unité	1	10'000	40'000
5	Bois - tringle de 2*7*400cm (bois dur)	pce	4	unité	1	5'000	20'000
6	Bois Ravinala - Rapaka honkona/planche 1.5x 30 x 300 cm	paquet	2	unité	1	3'500	7'000
7	Feuille Ravinala - Falafa - 50 pces - en paquet de 50 pce	paquet	4	unité	1	2'000	8'000
8	Feuille Ravinala - Ravimpontsy ou Rati - 50 pces (Ravinala) - en	paquet	4	unité	1	1'500	6'000
9	Fitoroka Ø 4cm x 400cm / Gaulette	pce	3	unité	1	500	1'500
10	Afotra (liane pour attacher le rati)	paquet	5	paquet	1	100	500
B	MATERIAUX - FIXATION					sous-total B	55'000.00
11	Corde nylon 3mm de 100m	rouleau	1	unité	1	5'000	5'000
12	Corde nylon 12mm de 100m	rouleau	1	unité	1	20'000	20'000
13	Fil d'acier galvanisé 1.5 ou 2 mm - rouleau 5 mètre	rouleau	1	unité	1	20'000	20'000
14	Pointe (clous) 100 mm	kg	1	unité	1	5'000	5'000
15	Pointe (clous) 50 mm	kg	1	unité	1	5'000	5'000
C	MAIN D'OEUVRE					sous-total C	60'000.00
1	Chef Charpentier	pers	3	jour	1	10'000	30'000
2	Aide charpentier	pers	3	jour	2	5'000	30'000
TOTAL DU BASKET CASH POUR SHELTER							350'000.00

Cette liste pourrait être transformée en document plus compréhensible pour les bénéficiaires avec des dessins et/ou des images.



Cluster Abris / Habitat Madagascar
ShelterCluster.org
Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+ C IFRC

ORGANIGRAMME RECOMMANDÉ POUR LA GESTION COMMUNAUTAIRE POUR UN PROGRAMME TMC HABITAT

1 Comité de ciblage communautaire par Commune

membres selon nombre de Fokontany:

1 président, 1 adjoint + 1 représentant de chaque Fokontany

1 Comité de Reconstruction par Fokontany

5 membres:

1 président, 1 adjoint et 3 autres membres de la communauté

Ménages affectés les plus vulnérables bénéficiaire groupé par 10 ménages

1 Président + 1 Trésorier par groupe

Référence outil d'implémentation TMC.H




Cluster Abris / Habitat Madagascar
ShelterCluster.org
Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+ C IFRC

formulaire
TMC.H-10

ORGANIGRAMME RECOMMANDÉ POUR LA GESTION UN PROGRAMME TMC HABITAT

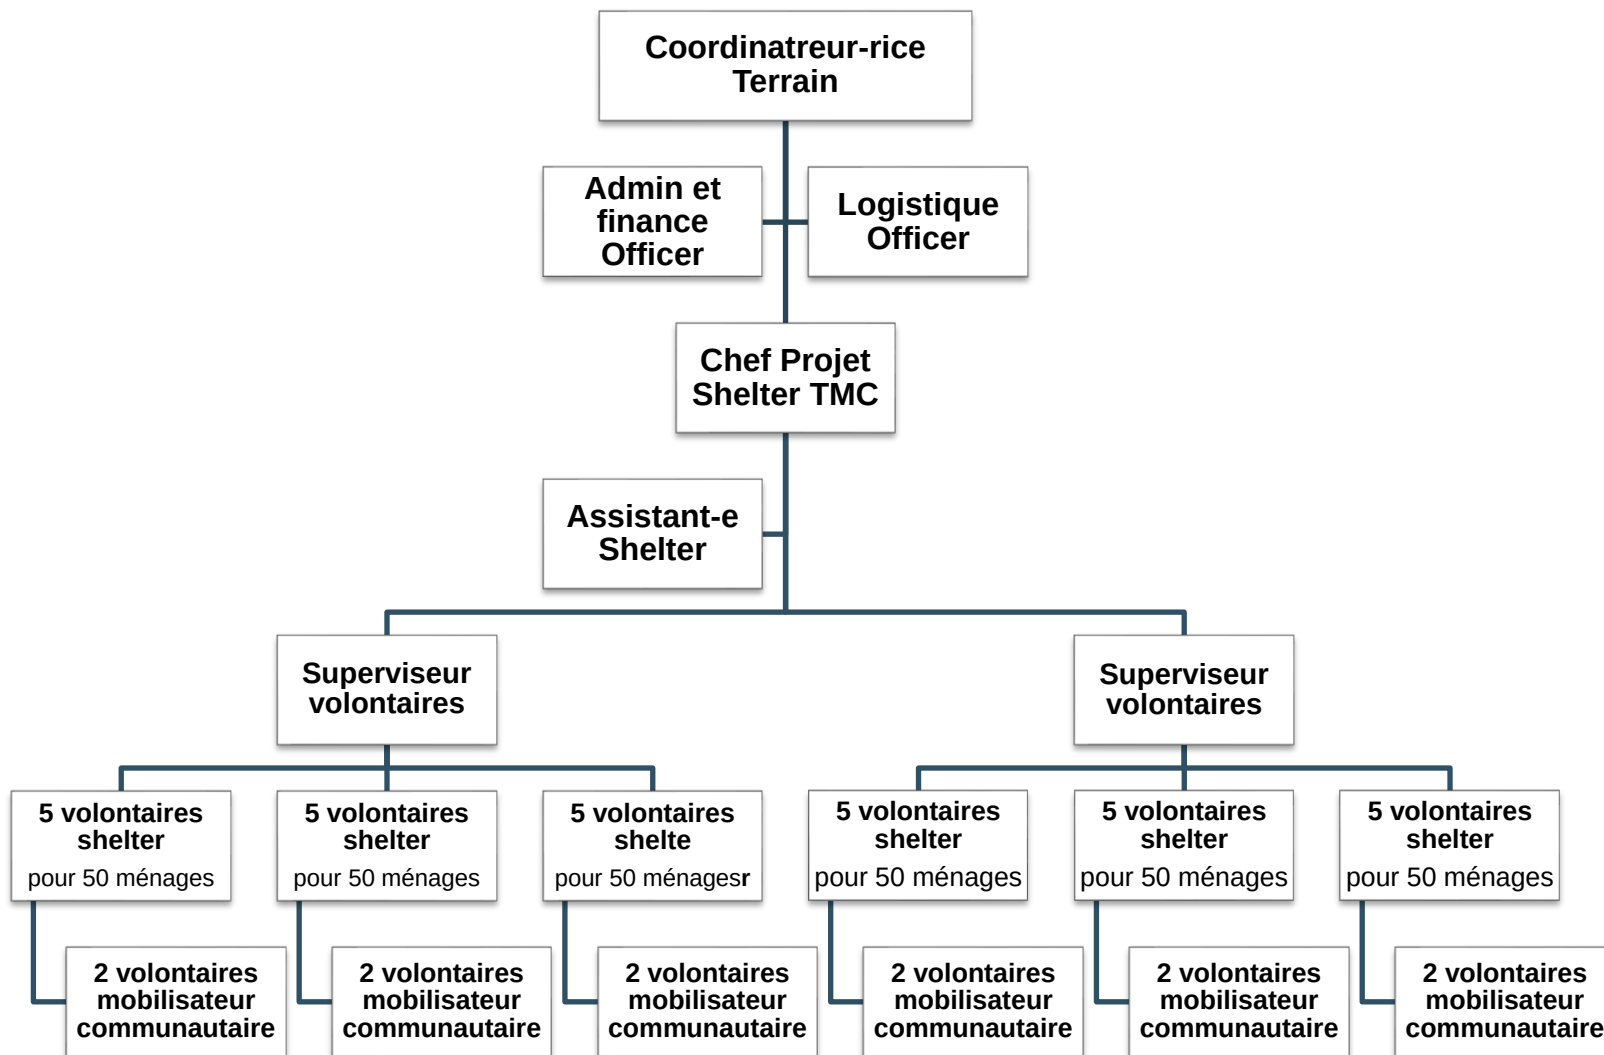

Référence outil d'implémentation TMC.H



Cluster Abris / Habitat Madagascar

ShelterCluster.org

Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+ C IFRC

formulaire
TMC.H-11

Recommandations : Accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons avec les groupes de ménages bénéficiaires (lettre d'engagement)

Par la signature de cet accord de coopération entre le Comité de Ciblage et Reconstruction (ou Comité de Reconstruction) de chaque Fokontany et les représentants des groupes de ménages sélectionnés et le partenaire du programme en tant que témoin, les bénéficiaires du groupe s'engagent à :

1. Utiliser l'argent reçu en respectant les conditionnalités demandées ci-dessous:
 - a. Participer à la séance de sensibilisation en construction améliorée (BBS) et à la formation "remplissage des fiches" et "tenue du journal de dépense" permettant de recevoir le premier versement.
 - b. Reconstruire et/ou réparer sa maison avec les améliorations constructives proposées.
2. Elire un président et un trésorier représentant le groupe
3. Le trésorier du groupe aidera chacun des ménages à entrer les dépenses dans un journal
4. Remplir la fiche illustrée pour l'achat de matériel, outils ou engagement de main d'oeuvre
5. S'entraider entre ménages pour reconstruire ou réparer les maisons du groupe
6. Commander ensemble les matériaux de construction nécessaires pour limiter les coûts de transport
7. Planifier et se coordonner ensemble.
8. Planifier un calendrier d'activités afin que chacun d'entre vous puisse avoir sa maison dès que possible.
9. Aider d'abord les familles d'entre vous les plus vulnérables qui ont le plus besoin de support.
10. Respecter cet accord ainsi que l'accord tripartite de coopération pour la reconstruction et réparation de maisons entre le maire, le comité de ciblage et reconstruction du Fokontany et la CRM

Référence outil d'implémentation TMC.H



Cluster Abris / Habitat Madagascar
ShelterCluster.org
Assurant la coordination du secteur abris humanitaires



+ CIFRC

formulaire
TMC.H-03

formulaire
TMC.H-02

MERCI !

Questions?

Remarques

